



2017 ARDAHAN İL YATIRIMLARI



SAĞLIK

POSOF E2 ENTEGRE HASTANESİ YAPIMI

Başlama Tarihi : 08.09.2016

Bitiş Tarihi : 12.10.2017'dir

Proje Bedeli : 5.770.200 TL'dir.

Fiziki Gerçekleşme Oranı: %65'tir.



ÇILDİR E2 ENTEGRE HASTANESİ YAPIMI

Başlama Tarihi : 08.09.2016 Bitiş Tarihi : 12.10.2017

Proje Bedeli : 5.515.320 TL Fiziki Gerçekleşme Oranı: %1'dir.



POSOF 6 DAİRELİ LOJMAN YAPIMI



Proje Bedeli : 734.347 TL

Başlama Tarihi : 25.05.2016

Bitiş Tarihi : 2017

Fiziki Gerçekleşme Oranı: % 95'tir.

40 YATAKLI GÖLE DEVLET HASTANESİ VE 6 DAİRELİ LOJMAN

Proje Bedeli : 11.892.649 TL
Başlama Tarihi : 26.04.2016
Bitiş Tarihi : 13.12.2016
Geçici kabul aşamasındadır.





EĞİTİM

HOCVAN HASKÖY 8 DERSLİKLİ İLKOKUL YAPIMI



Proje Bedeli :1.534.000 TL
Başlama Tarihi :2015
Bitiş Tarihi :2017
Fiziki Gerçekleşme Oranı :% 100'dür.

GÖLE MERKEZ 8 DERSLİKLİ İLKOKUL YAPIMI



| | |
|--------------------------|---------------|
| Proje Bedeli | :2.100.000 TL |
| Başlama Tarihi | :2015 |
| Bitiş Tarihi | :2017 |
| Fiziki Gerçekleşme Oranı | :% 95'dir. |

HANAK MERKEZ 8 DERSLİKLİ İLKOKUL YAPIMI



Proje Bedeli : 1.700.000 TL
Başlama Tarihi : 22.07.2015
Bitiş Tarihi : 2017
Fiziki Gerçekleşme Oranı:%62

ULAŐTIRMA

SUSUZ ÇAMLIÇATAK YOLU

- Proje Uzunluğu: 50 km (2x2 Sathi Kaplama üzeri Bitümlü Sıcak Karışım)
- Proje Bedeli : 100.000.000 TL
- Toplam Harcama : 51.104.000 TL
- Yapılan Uzunluk : 15,50 km
- Nakdi Gerçekleşme: % 51
- Fiziki Gerçekleşme: %51

2017 yılında

- Hedeflenen Harcama: 25.000.000 TL
- Hedeflenen Uzunluk: 7,5 km
- Yüklenici Firma : İSMERT

Başlama Tarihi :15.06.2012

Bitiş Tarihi : 2018



ARDAHAN KUZEY GÜNEY ÇEVRE YOLLARI

- Proje Uzunluğu :28 km(2x2 2x1 Bitümlü Sıcak Karışım)
- Proje Bedeli : 51.072.000 TL
- Toplam Harcama : 31.832.000 TL
- Yapılan Uzunluk : 11 km
- Nakdi Gerçekleşme:% 62
- Fiziki Gerçekleşme: %62

2017 yılında

- Hedeflenen Harcama:24.000.000 TL
- Hedeflenen Uzunluk:12 km
- Yüklenici Firma : YTY + İMAJ
- Başlama Tarihi : 13.05.2015
- Bitiş Tarihleri : 2017



ARDAHAN ŞEHİR GEÇİŞİ

- Proje Uzunluğu :6,5 km (2x1 Bitümlü Sıcak Karışım)
- Proje Bedeli : 10.000.000 TL
- Toplam Harcama : 388.000 TL
- Yapılan Uzunluk : 6,5 TY BSK
- Nakdi Gerçekleşme :% 4
- Fiziki Gerçekleşme: % 4

2017 yılında

- Hedeflenen Harcama :10.000.000 TL
- Hedeflenen Uzunluk :6,5 km
- Yüklenici Firma : NUDA + ROSİ
- Başlama Tarihi : 10.01.2017
- Bitiş Tarihi : 2017



GÖLE- ARDAHAN DEVLET YOLU

- Proje Uzunluğu :41 km (2x2 Bitümlü Sıcak Karışım)
- Proje Bedeli : 160.000.000 TL
- Yapılan Uzunluk : 14 km
- Nakdi Gerçekleşme :% 0

2017 yılında ;

- Hedeflenen Harcama :5.000.000 TL
- Başlama Tarihi : 01.07.2017
- Bitiş Tarihi : 12.2018




DAMAL (ILGAR BAKIMEVİ) POSOF

- Proje Uzunluğu : 21 km (2x1 Sathi kaplama)
- Proje Bedeli : 18.400.000 TL
- Toplam Harcama : 14.100.000 TL
- Yapılan Uzunluk :10,5 km
- Nakdi Gerçekleşme:% 10,5
- Fiziki Gerçekleşme: %10,5

2017 yılında

- Hedeflenen Harcama :5.000.000 TL
- Hedeflenen Uzunluk :3 km
- Yüklenici Firma :TEMELDAŞ+SEBA
- Başlama Tarihi :13.08.2012
- Bitiş Tarihi : 2017

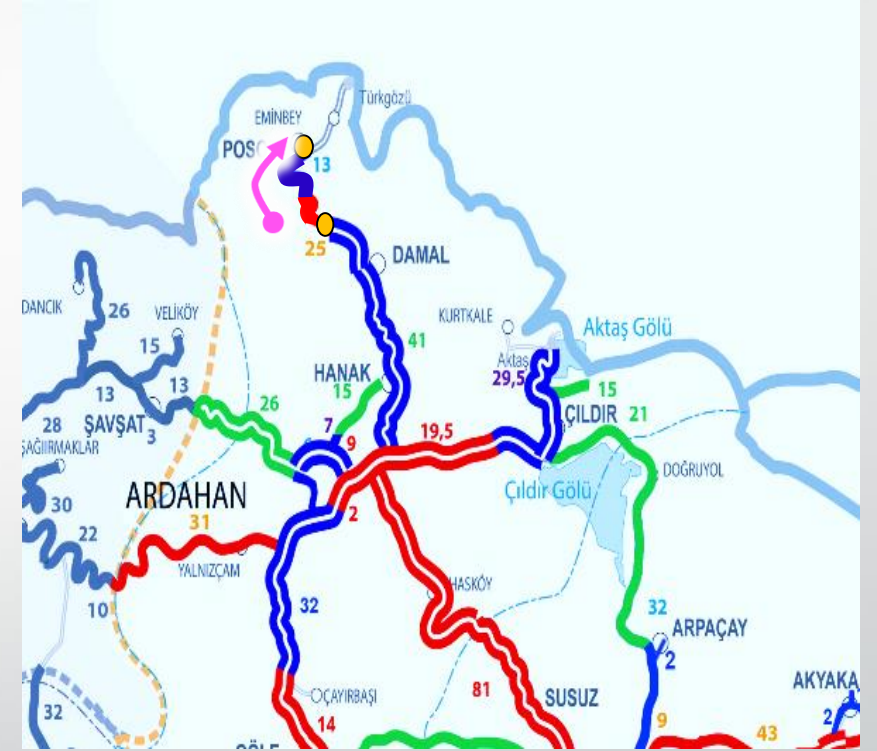

(ARDAHAN-ÇILDIR) AYR.-HANAK-POSOF-TÜRKGÖZÜ SINIR KAPISI

- Proje Uzunluğu :21 km (41 km ile 62 km arası 2x2 Bitümlü Sıcak Karışım)

İHALE YAPILMASI PLANLANMAKTADIR.

Üzerinde yer alacak tüneller:

Gümüşkavak Tüneli : 3.363 metre (çift tüp)

Eminbey Tüneli : 260 metre (çift tüp)



(ARDAHAN-KARS) AYR-ÇILDIR YOLU

- Proje Uzunluğu :32 km (2x2 Bitümlü Sıcak Karışım)
- Proje Bedeli : 89.000.000 TL
- Toplam Harcama : 3.400.000 TL
- Yapılan Uzunluk : 19 km
- Nakdi Gerçekleşme :% 4
- Fiziki Gerçekleşme : %4


2017 yılında

- Hedeflenen Harcama :22.000.000 TL
- Hedeflenen Uzunluk : 5 km
- Yüklenici Firma : CEMİLOĞLU + İMAJ
- Başlama Tarihi : 28.12.2016
- Bitiş Tarihi : 2019



(ARDAHAN-ÇILDIR) AYR.-HANAK-POSOF-TÜRKGÖZÜ SINIR KAPISI & ILGAR TÜNELİ

- Proje Uzunluğu :41 km (0 km ile 41 km arası 2x2 Bitümlü Sıcak Karışım)
- Proje Bedeli : 420.000.000 TL
- Toplam Harcama : 500.000 TL
- Yapılan Uzunluk : 250 m
- Nakdi Gerçekleşme : % 0,12
- Fiziki Gerçekleşme:% 0,12
- 2017 yılında ;
- Hedeflenen Harcama : 420.000.000 TL
- Hedeflenen Uzunluk : 391 m
- Ilgar Tüneli :4,9 km çift tüp
- Köprüler : 3 adet 0,48 km
- Yüklenici Firma : PERS + ASTRO
- Başlama Tarihi : 31.01.2017
- Bitiş Tarihi :2019

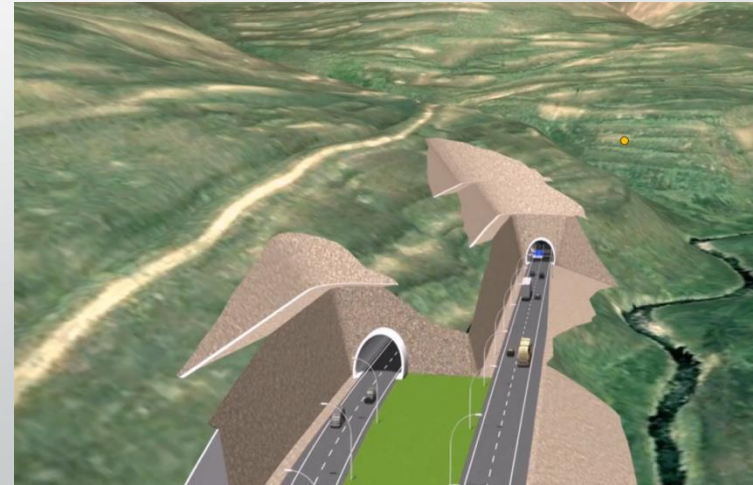

ÇILDIR-AKTAŞ SINIR KAPISI DEVLET YOLU

- Proje Uzunluğu :16,3 km (2x2 Bitümlü Sıcak Karışım)
- Proje Bedeli : 142.000.000 TL
- Toplam Harcama : 73.171.000 TL
- Yapılan Uzunluk : 7,5 BY BSK ve 750 m çift tüp
- Nakdi Gerçekleşme :% 52
- Fiziki Gerçekleşme : %52

2017 yılında

- Hedeflenen Harcama :60.000.000 TL
- Hedeflenen Uzunluk :8 km

Üzerinde yer alan tüneller:

- Aşıksenklik Tüneli :2300 metre çift tüp
- Yüklenici Firma: ZEY YAPI
- Başlama Tarihi : 18.05.2016
- Bitiş Tarihi : 2020



DIĐER KAMU HİZMETLERİ

GÖLE GENÇLİK MERKEZİ




| | |
|--------------------------|----------------|
| Proje Bedeli | : 1.590.000 TL |
| Başlama Tarihi | : 15.01.2016 |
| Bitiş Tarihi | : 08.11.2017 |
| Fiziki Gerçekleşme Oranı | : % 95 |

ARDAHAN MERKEZ SPORCU FABRİKASI

Proje Bedeli :8.500.000 TL
Sözleşme Tarihi :04.05.2017
İşin Bitim Tarihi :31.07.2018
Fiziki Gerçekleşme Oranı : % 10



ARDAHAN MERKEZ STADYUM MODERNİZASYON

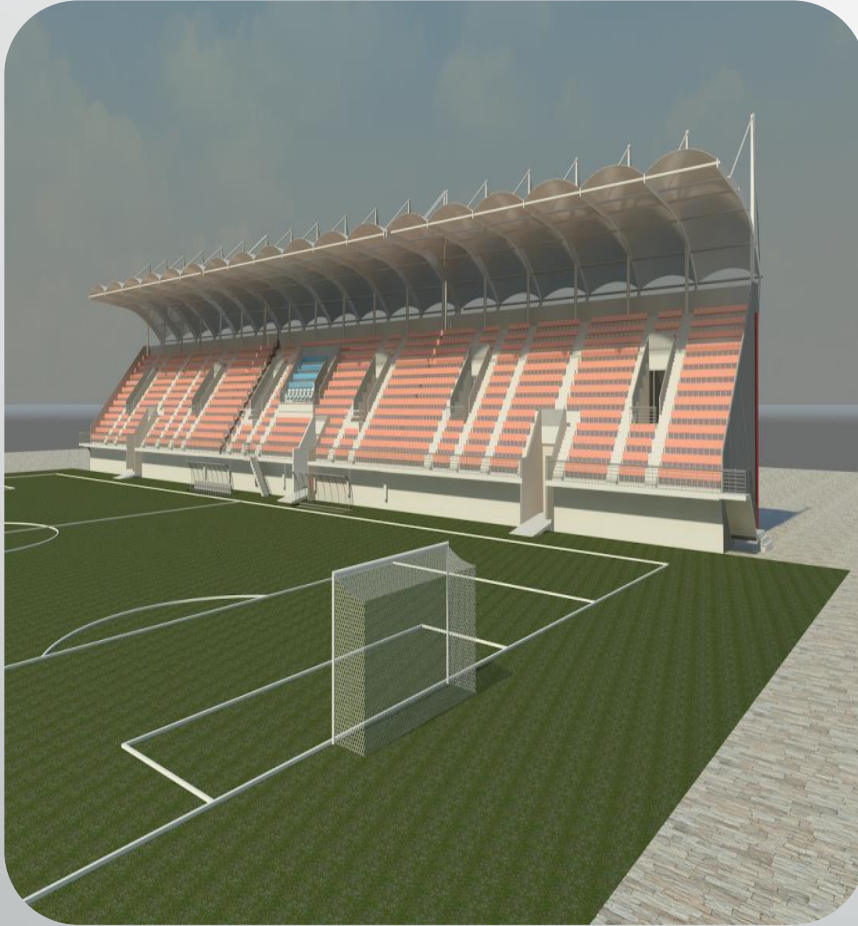

Proje Bedeli : 9.000.000 TL
Başlama Tarihi :01.03.2017
Bitiş Tarihi :25.05.2018

HALİL EFENDİ SENTETİK ÇİM YÜZEYLİ FUTBOL SAHASI VE TRİBÜN

Proje Bedeli : 1.000.000 TL
Sözleşme Tarihi : 16.02.2016
İşin Bitim Tarihi : 2017
Fiziki Gerçekleşme Oranı : %90



ARDAHAN PTT BAŐMÜDÜRLÜĐÜ VE MERKEZ HİZMET BİNASI



Proje Bedeli : 3.450.000 TL
Başlama Tarihi : 01.06.2016
Bitiş Tarihi : 2017
Fiziki Gerçekleşme : % 60

POSOF PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI

Proje Bedeli: 948.000 TL
Başlama Tarihi: 18.08.2016
Bitiş Tarihi: 2017
Fiziki Gerçekleşme: % 60



ARDAHAN KÜLTÜR MERKEZİ YAPIMI

Proje Bedeli :18.318.000 TL

Başlama Tarihi:2017



ARDAHAN DSİ 243. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TESİSLERİ



Proje Bedeli : 11.744.000 TL
Başlama Tarihi : 12.05.2017
Bitiş Tarihi : 21.07.2019
Fiziki Gerçekleşme: %2



DURANÇAM BARAJI (GÖLETİ)

Proje Bedeli :12.624.600 TL
Başlama Tarihi :2016
Bitiş Tarihi :2019



AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ VE SOSYAL HİZMET MERKEZ BİNASI



Proje Bedeli : 4.474.178 TL

Başlama Tarihi :15.04.2017

Bitiş Tarihi : 22.07.2018'dir.

Fiziki Gerçekleşme Oranı: %3



ARDAHAN SİTE MODELİ YAŞLI EVİ



| | |
|--------------------|----------------|
| Proje Bedeli | : 7.127.358 TL |
| Başlama Tarihi | :15.04.2017 |
| Bitiş tarihi | :04.11.2018 |
| Fiziki Gerçekleşme | :%12 |



ARDAHAN 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ



İhale çalışmaları devam etmektedir.



ARDAHAN İL ÖZEL İDARESİ

ARDAHAN MERKEZ KÖYLERİ 1 VE 2'NCİ KAT ASLFALT SATHİ KAPLAMA (KÖYDES)



Proje Bedeli :2.540.208 TL
Başlama Tarihi :2017
Bitiş Tarihi :2017



ARDAHAN İLİ GÖLE İLÇESİ YAYLA YOLLARI (DURANÇAM, MOLLAHASAN, KÜÇÜK ALTUNBULAK, YAĞMUROĞLU VE ÇARDAKLI) (AKAKP)

Proje Bedeli :847.000 TL
Başlama Tarihi :05.06.2017
Bitiş Tarihi :13.09.2017



ARDAHAN İLİ ÇILDIR İLÇESİ YAYLA YOLLARI (DAMLICA,SABAHOLDU,AKDARI VE KENARBEL) (AKAKP)



Proje Bedeli:845.000 TL
Başlama Tarihi:12.06.2017
Bitiş Tarihi:31.08.2017

1 GRUP BEŐIKTAŐ-ÇATALKÖPRÜ-ÇİMENKAYA-ÇAKIRÜZÜM- ÇULLU-DENGELİ, FİLİZLİ, HOŐTÜLBENT-YELEÇLİ-YENİKÖY HAYVAN İÇME SUYU YAPIM İŐİ (AKAKP)


Proje Bedeli :820.100 TL
BaŐlama Tarihi :30.05.2017
BitiŐ Tarihi :29.07.2017





TURİZM

YALNIZÇAM UĞURLUDAĞ KAYAK TESİSLERİ

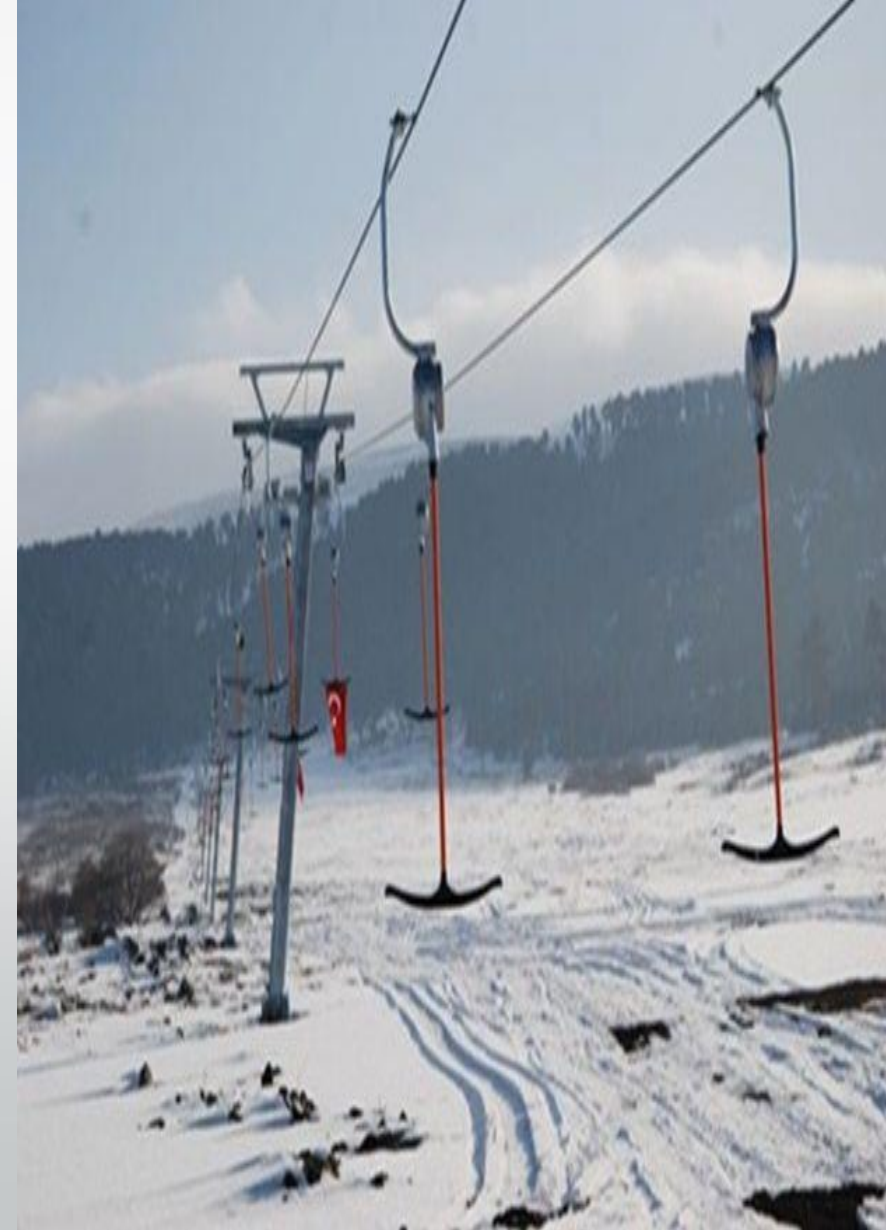

Toplam Alan : 2520 Hektar
Pist Uzunluğu : 8700 m
Proje Bedeli :6.200.000 Euro
Proje Onay Tarihi :2010
Bitiş Tarihi :2019

YALNIZÇAM UĞURLUDAĞ KAYAK TESİSLERİ HALI SAHA YAPIM



Proje Bedeli :480.100 TL
Başlama Tarihi :24.05.2017
Bitiş Tarihi :23.07.2017

ÇILDIR GÖLÜ REKRESYON ALANI BUNGALOV EVLERİ YAPIM İŞİ



Proje Bedeli :418.000 TL
Başlama Tarihi :14.04.2017
Bitiş Tarihi :14.09.2017

ÇILDIR REKREASYON ALANI YAPIM İŞİ



Proje Bedeli :2.773.000 TL

Başlama Tarihi :15.04.2016

Bitiş Tarihi :2017

GÖLE TELESKİ KAYAK TESİSİ

Proje Bedeli:2.000.000 TL

İhale Tarihi: 29.06.2017

195 ada 1 ve 2 nolu parsel üzerine yapılacaktır.

Pist uzunluğu yaklaşık 1000 m civarındadır.





DİN HİZMETLERİ

SERHAT ULU CAMİİ



Proje Bedeli :2.612.520 TL
Başlama Tarihi : 01.03.2013
Bitiş Tarihi :15.06.2018
Yeri : Karagöl Mah.
Fiziki Gerçekleşme Oranı:%50



KARAGÖL CAMİİ



Proje Bedeli : 2.177.100 TL
Başlama Tarihi :01.06.2013
Bitiş Tarihi :15.11.2018
Fiziki Gerçekleşme Oranı:%40



100 KİŞİLİK YATILI KUR'AN KURSU

Proje Bedeli : 3.414.200 TL
Başlama Tarihi : 01.06.2013
Bitiş Tarihi : 15.07.2017
Fiziki Gerçekleşme Oranı:%95

